ПРИМЕР движения заявки в служебной группе

БОТ РОЛЬ ПРОРАБ ниже работа в чате бота

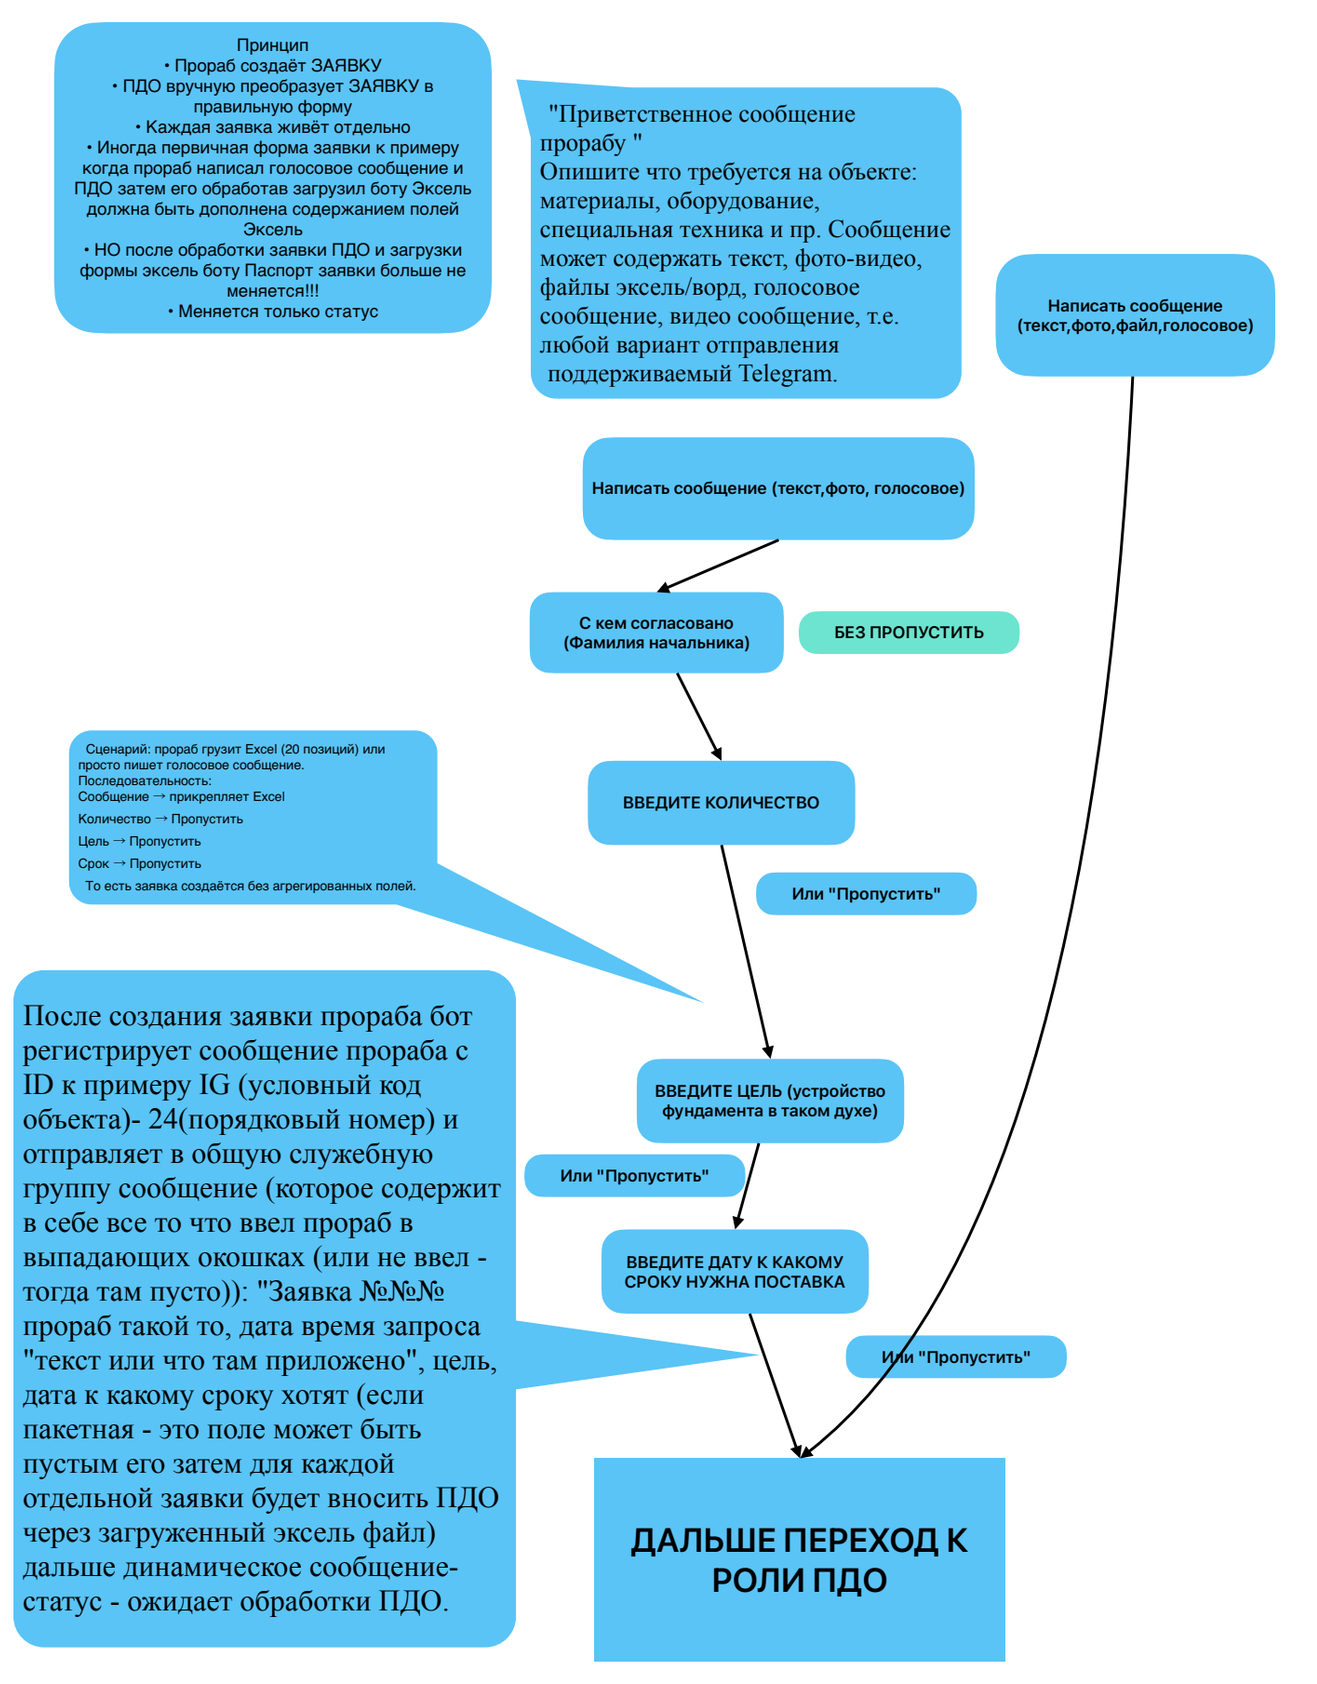

НОВАЯ ЗАЯВКА

Принцип
• Прораб создаёт ЗАЯВКУ
• ПДО вручную преобразует ЗАЯВКУ в правильную форму
• Каждая заявка живёт отдельно
• Иногда первичная форма заявки к примеру когда прораб написал голосовое сообщение и ПДО затем его обработав загрузил боту Эксель должна быть дополнена содержанием новой Эксель
• НО после обработки заявки ПДО и загрузки формы эксель боту Паспорт заявки больше не меняется!!!
• Меняется только статус

"Приветственное сообщение прорабу "
Опишите что требуется на объекте: материалы, оборудование, специальная техника и пр. Сообщение может содержать текст, фото-видео, файлы эксель/ворд, голосовое сообщение, видео сообщение, т.е. любой вариант отправления поддерживаемый Telegram.

Написать сообщение (текст,фото,файл,голосовое)

Написать сообщение (текст,фото, голосовое)

С кем согласовано (Фамилия начальника)

БЕЗ ПРОПУСТИТЬ

ВВЕДИТЕ КОЛИЧЕСТВО

Или "Пропустить"

ВВЕДИТЕ ЦЕЛЬ (устройство фундамента в таком духе)

Или "Пропустить"

ВВЕДИТЕ ДАТУ К КАКОМУ СРОКУ НУЖНА ПОСТАВКА

Или "Пропустить"

Сценарий: прораб грузит Excel (20 позиций) или просто пишет голосовое сообщение.
Последовательность:
Сообщение → прикрепляет Excel
Количество → Пропустить
Цель → Пропустить
Срок → Пропустить
То есть заявка создаётся без агрегированных полей.

После создания заявки прораба бот регистрирует сообщение прораба с ID к примеру IG (условный код объекта)- 24(порядковый номер) и отправляет в общую служебную группу сообщение (которое содержит в себе все то что ввел прораб в выпадающих окошках (или не ввел - тогда там пусто)): "Заявка №№№ прораб такой то, дата время запроса "текст или что там приложено", цель, дата к какому сроку хотят (если пакетная - это поле может быть пустым его затем для каждой отдельной заявки будет вносить ПДО через загруженный эксель файл) дальше динамическое сообщение-статус - ожидает обработки ПДО.

ДАЛЬШЕ ПЕРЕХОД К РОЛИ ПДО

АКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ

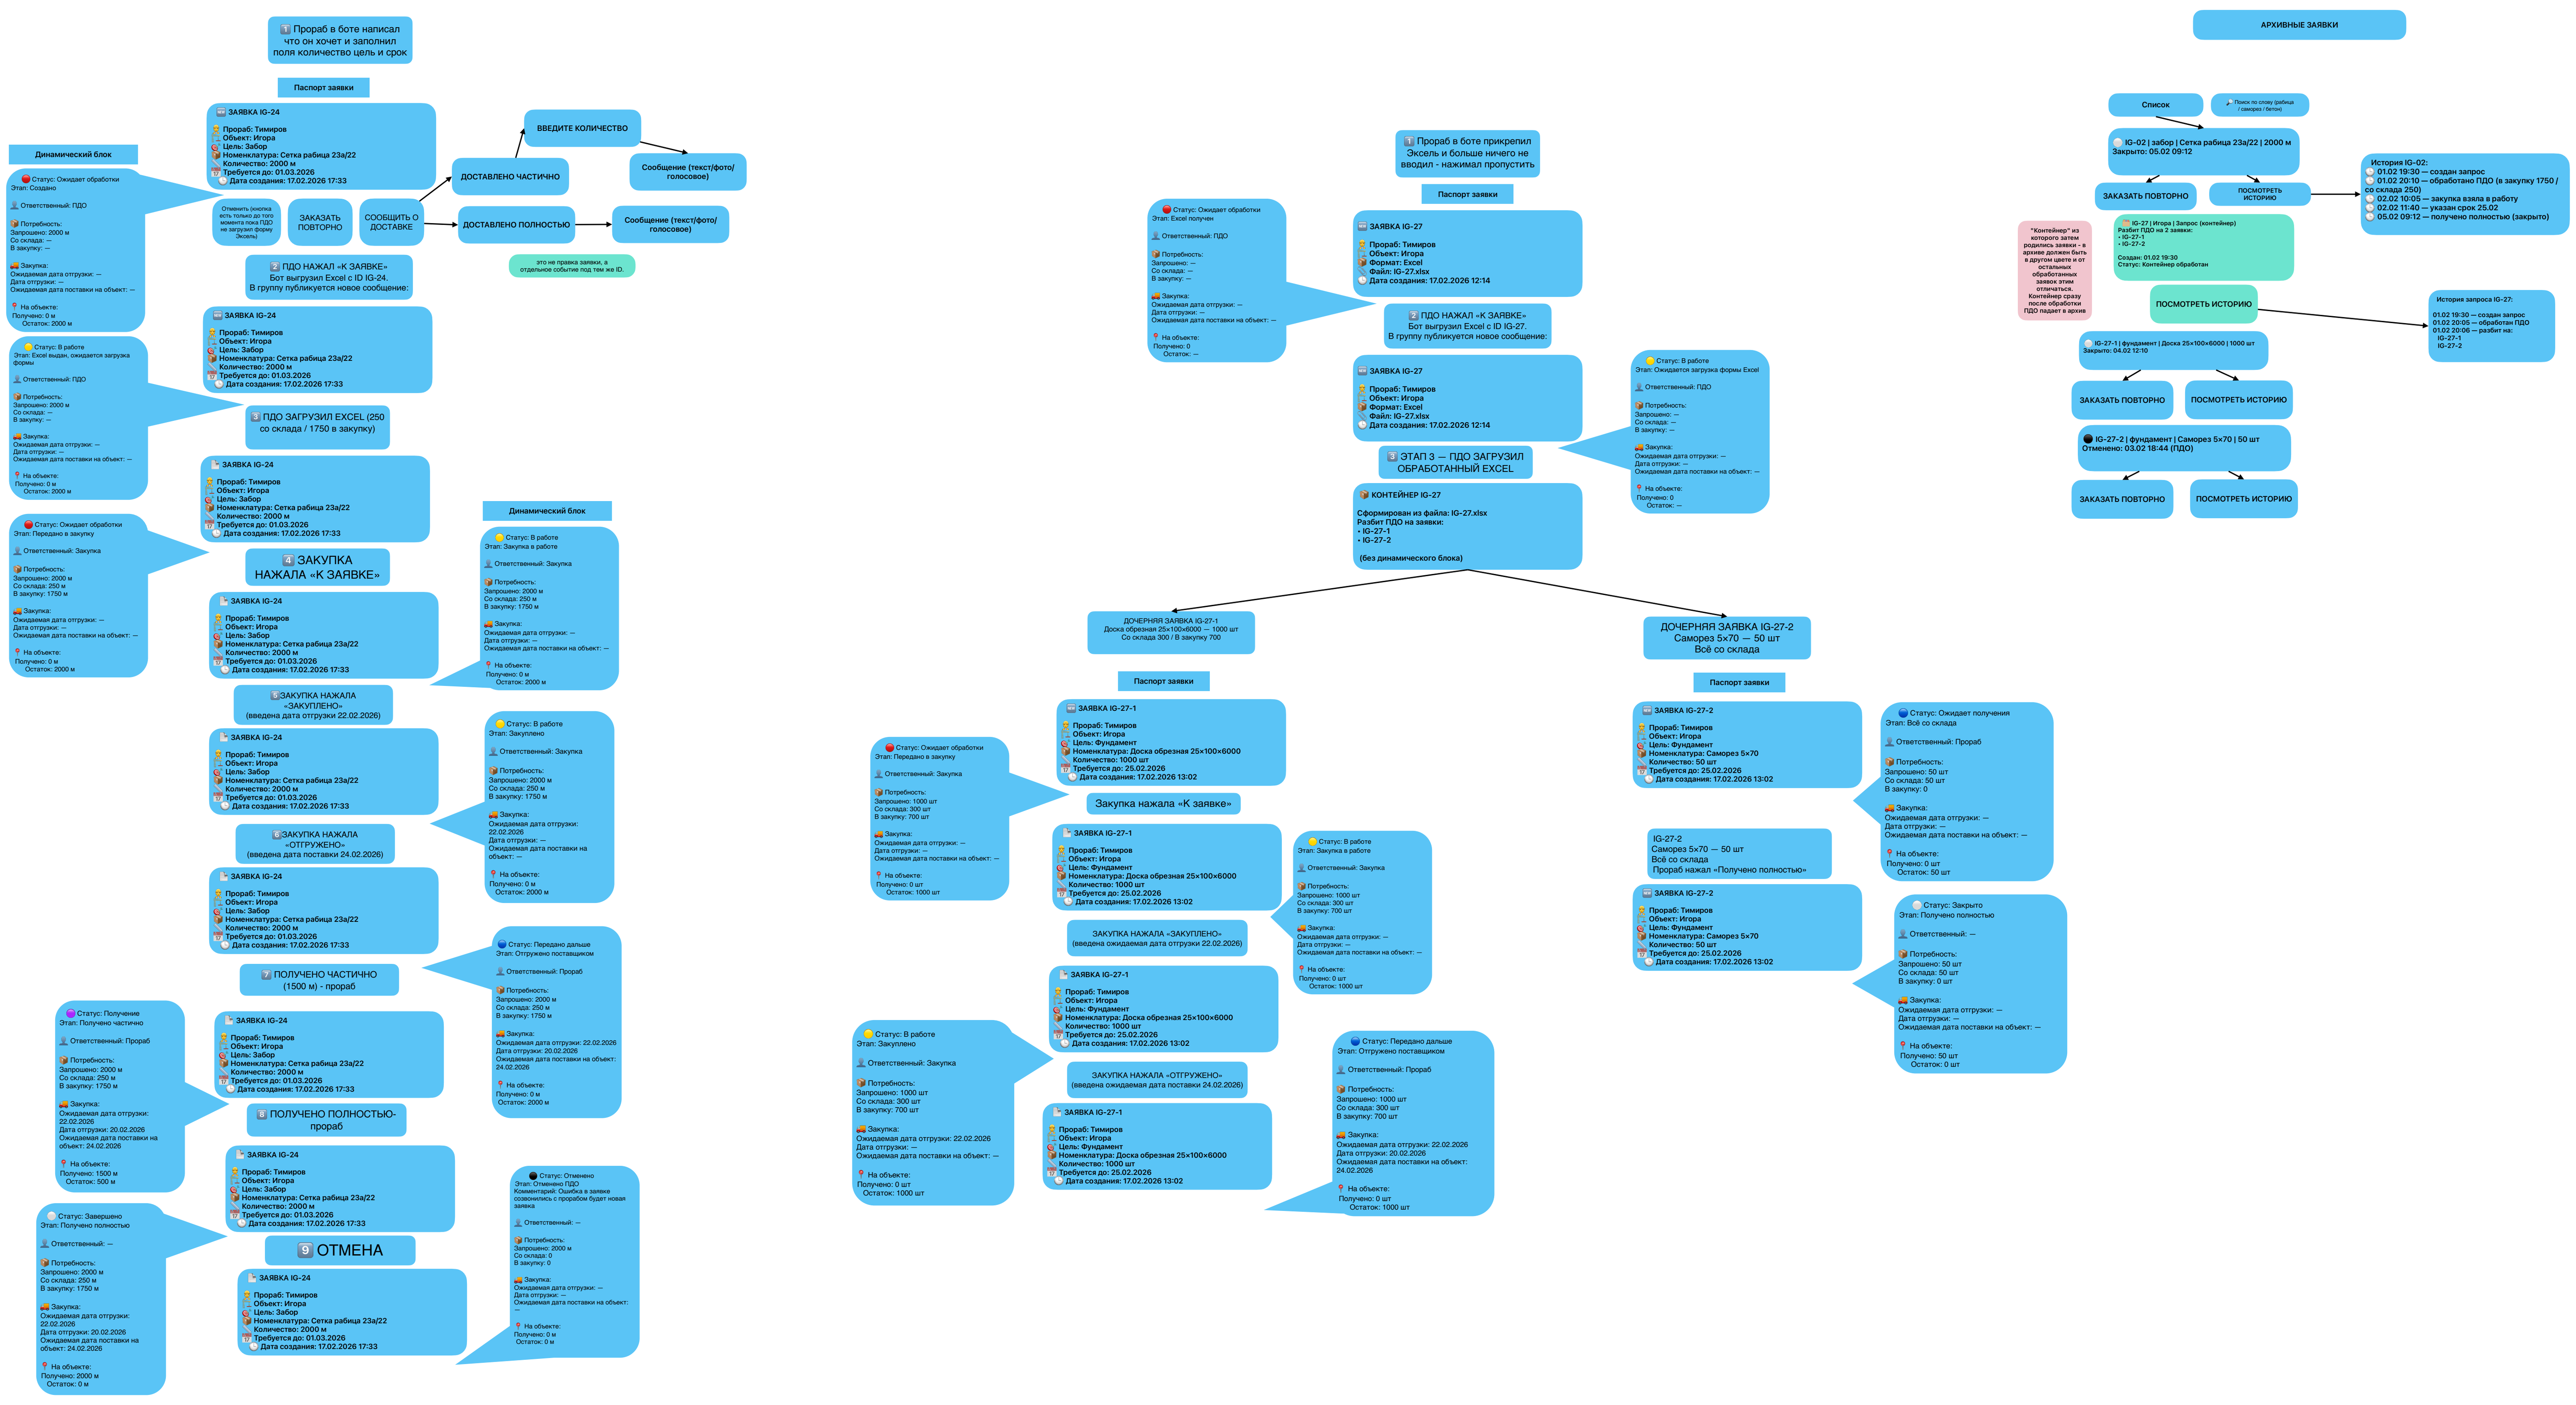

1️⃣ Прораб в боте написал что он хочет и заполнил поля количество цель и срок

Паспорт заявки

🆕 ЗАЯВКА IG-24
👷 Прораб: Тимиров
🏗 Объект: Игора
🎯 Цель: Забор
📦 Номенклатура: Сетка рабица 23а/22
Количество: 2000 м
📅 Требуется до: 01.03.2026
🕓 Дата создания: 17.02.2026 17:33

Отменить (кнопка есть только до того момента пока ПДО не загрузил форму Эксель)

ЗАКАЗАТЬ ПОВТОРНО

СООБЩИТЬ О ДОСТАВКЕ

ДОСТАВЛЕНО ЧАСТИЧНО

ВВЕДИТЕ КОЛИЧЕСТВО

Сообщение (текст/фото/голосовое)

ДОСТАВЛЕНО ПОЛНОСТЬЮ

Сообщение (текст/фото/голосовое)

это не правка заявки, а отдельное событие под тем же ID.

Динамический блок

🔴 Статус: Ожидает обработки
Этап: Создано
👤 Ответственный: ПДО
📦 Потребность:
Запрошено: 2000 м
Со склада: —
В закупку: —
🚚 Закупка:
Ожидаемая дата отгрузки: —
Дата отгрузки: —
Ожидаемая дата поставки на объект: —
📍 На объекте:
Получено: 0 м
Остаток: 2000 м

2️⃣ ПДО НАЖАЛ «К ЗАЯВКЕ»
Бот выгрузил Excel с ID IG-24.
В группу публикуется новое сообщение:

🆕 ЗАЯВКА IG-24
👷 Прораб: Тимиров
🏗 Объект: Игора
🎯 Цель: Забор
📦 Номенклатура: Сетка рабица 23а/22
Количество: 2000 м
📅 Требуется до: 01.03.2026
🕓 Дата создания: 17.02.2026 17:33

🟡 Статус: В работе
Этап: Excel выдан, ожидается загрузка формы
👤 Ответственный: ПДО
📦 Потребность:
Запрошено: 2000 м
Со склада: —
В закупку: —
🚚 Закупка:
Ожидаемая дата отгрузки: —
Дата отгрузки: —
Ожидаемая дата поставки на объект: —
📍 На объекте:
Получено: 0 м
Остаток: 2000 м

3️⃣ ПДО ЗАГРУЗИЛ EXCEL (250 со склада / 1750 в закупку)

📄 ЗАЯВКА IG-24
👷 Прораб: Тимиров
🏗 Объект: Игора
🎯 Цель: Забор
📦 Номенклатура: Сетка рабица 23а/22
Количество: 2000 м
📅 Требуется до: 01.03.2026
🕓 Дата создания: 17.02.2026 17:33

🔴 Статус: Ожидает обработки
Этап: Передано в закупку
👤 Ответственный: Закупка
📦 Потребность:
Запрошено: 2000 м
Со склада: 250 м
В закупку: 1750 м
🚚 Закупка:
Ожидаемая дата отгрузки: —
Дата отгрузки: —
Ожидаемая дата поставки на объект: —
📍 На объекте:
Получено: 0 м
Остаток: 2000 м

4️⃣ ЗАКУПКА НАЖАЛА «К ЗАЯВКЕ»

📄 ЗАЯВКА IG-24
👷 Прораб: Тимиров
🏗 Объект: Игора
🎯 Цель: Забор
📦 Номенклатура: Сетка рабица 23а/22
Количество: 2000 м
📅 Требуется до: 01.03.2026
🕓 Дата создания: 17.02.2026 17:33

Динамический блок

🟡 Статус: В работе
Этап: Закупка в работе
👤 Ответственный: Закупка
📦 Потребность:
Запрошено: 2000 м
Со склада: 250 м
В закупку: 1750 м
🚚 Закупка:
Ожидаемая дата отгрузки: —
Дата отгрузки: —
Ожидаемая дата поставки на объект: —
📍 На объекте:
Получено: 0 м
Остаток: 2000 м

5️⃣ЗАКУПКА НАЖАЛА «ЗАКУПЛЕНО»
(введена дата отгрузки 22.02.2026)

📄 ЗАЯВКА IG-24
👷 Прораб: Тимиров
🏗 Объект: Игора
🎯 Цель: Забор
📦 Номенклатура: Сетка рабица 23а/22
Количество: 2000 м
📅 Требуется до: 01.03.2026
🕓 Дата создания: 17.02.2026 17:33

🟡 Статус: В работе
Этап: Закуплено
👤 Ответственный: Закупка
📦 Потребность:
Запрошено: 2000 м
Со склада: 250 м
В закупку: 1750 м
🚚 Закупка:
Ожидаемая дата отгрузки: 22.02.2026
Дата отгрузки: —
Ожидаемая дата поставки на объект: —
📍 На объекте:
Получено: 0 м
Остаток: 2000 м

6️⃣ЗАКУПКА НАЖАЛА «ОТГРУЖЕНО»
(введена дата поставки 24.02.2026)

📄 ЗАЯВКА IG-24
👷 Прораб: Тимиров
🏗 Объект: Игора
🎯 Цель: Забор
📦 Номенклатура: Сетка рабица 23а/22
Количество: 2000 м
📅 Требуется до: 01.03.2026
🕓 Дата создания: 17.02.2026 17:33

🔵 Статус: Передано дальше
Этап: Отгружено поставщиком
👤 Ответственный: Прораб
📦 Потребность:
Запрошено: 2000 м
Со склада: 250 м
В закупку: 1750 м
🚚 Закупка:
Ожидаемая дата отгрузки: 22.02.2026
Дата отгрузки: 20.02.2026
Ожидаемая дата поставки на объект: 24.02.2026
📍 На объекте:
Получено: 0 м
Остаток: 2000 м

7️⃣ ПОЛУЧЕНО ЧАСТИЧНО (1500 м) - прораб

📄 ЗАЯВКА IG-24
👷 Прораб: Тимиров
🏗 Объект: Игора
🎯 Цель: Забор
📦 Номенклатура: Сетка рабица 23а/22
Количество: 2000 м
📅 Требуется до: 01.03.2026
🕓 Дата создания: 17.02.2026 17:33

🟣 Статус: Получение
Этап: Получено частично
👤 Ответственный: Прораб
📦 Потребность:
Запрошено: 2000 м
Со склада: 250 м
В закупку: 1750 м
🚚 Закупка:
Ожидаемая дата отгрузки: 22.02.2026
Дата отгрузки: 20.02.2026
Ожидаемая дата поставки на объект: 24.02.2026
📍 На объекте:
Получено: 1500 м
Остаток: 500 м

8️⃣ ПОЛУЧЕНО ПОЛНОСТЬЮ- прораб

📄 ЗАЯВКА IG-24
👷 Прораб: Тимиров
🏗 Объект: Игора
🎯 Цель: Забор
📦 Номенклатура: Сетка рабица 23а/22
Количество: 2000 м
📅 Требуется до: 01.03.2026
🕓 Дата создания: 17.02.2026 17:33

⚪ Статус: Завершено
Этап: Получено полностью
👤 Ответственный: —
📦 Потребность:
Запрошено: 2000 м
Со склада: 250 м
В закупку: 1750 м
🚚 Закупка:
Ожидаемая дата отгрузки: 22.02.2026
Дата отгрузки: 20.02.2026
Ожидаемая дата поставки на объект: 24.02.2026
📍 На объекте:
Получено: 2000 м
Остаток: 0 м

9️⃣ ОТМЕНА

📄 ЗАЯВКА IG-24
👷 Прораб: Тимиров
🏗 Объект: Игора
🎯 Цель: Забор
📦 Номенклатура: Сетка рабица 23а/22
Количество: 2000 м
📅 Требуется до: 01.03.2026
🕓 Дата создания: 17.02.2026 17:33

⚫ Статус: Отменено
Этап: Отменено ПДО
Комментарий: Ошибка в заявке созвонились с прорабом будет новая заявка
👤 Ответственный: —
📦 Потребность:
Запрошено: 2000 м
Со склада: 0
В закупку: 0
🚚 Закупка:
Ожидаемая дата отгрузки: —
Дата отгрузки: —
Ожидаемая дата поставки на объект: —
📍 На объекте:
Получено: 0 м
Остаток: 0 м

1️⃣ Прораб в боте прикрепил Эксель и больше ничего не вводил - нажимал пропустить

Паспорт заявки

🆕 ЗАЯВКА IG-27
👷 Прораб: Тимиров
🏗 Объект: Игора
📦 Формат: Excel
📎 Файл: IG-27.xlsx
🕓 Дата создания: 17.02.2026 12:14

🔴 Статус: Ожидает обработки
Этап: Excel получен
👤 Ответственный: ПДО
📦 Потребность:
Запрошено: —
Со склада: —
В закупку: —
🚚 Закупка:
Ожидаемая дата отгрузки: —
Дата отгрузки: —
Ожидаемая дата поставки на объект: —
📍 На объекте:
Получено: 0
Остаток: —

2️⃣ ПДО НАЖАЛ «К ЗАЯВКЕ»
Бот выгрузил Excel с ID IG-27.
В группу публикуется новое сообщение:

🆕 ЗАЯВКА IG-27
👷 Прораб: Тимиров
🏗 Объект: Игора
📦 Формат: Excel
📎 Файл: IG-27.xlsx
🕓 Дата создания: 17.02.2026 12:14

🟡 Статус: В работе
Этап: Ожидается загрузка формы Excel
👤 Ответственный: ПДО
📦 Потребность:
Запрошено: —
Со склада: —
В закупку: —
🚚 Закупка:
Ожидаемая дата отгрузки: —
Дата отгрузки: —
Ожидаемая дата поставки на объект: —
📍 На объекте:
Получено: 0
Остаток: —

3️⃣ ЭТАП 3 — ПДО ЗАГРУЗИЛ ОБРАБОТАННЫЙ EXCEL

📦 КОНТЕЙНЕР IG-27
Сформирован из файла: IG-27.xlsx
Разбит ПДО на заявки:
• IG-27-1
• IG-27-2
(без динамического блока)

ДОЧЕРНЯЯ ЗАЯВКА IG-27-1
Доска обрезная 25×100×6000 — 1000 шт
Со склада 300 / В закупку 700

Паспорт заявки

🆕 ЗАЯВКА IG-27-1
👷 Прораб: Тимиров
🏗 Объект: Игора
🎯 Цель: Фундамент
📦 Номенклатура: Доска обрезная 25×100×6000
Количество: 1000 шт
📅 Требуется до: 25.02.2026
🕓 Дата создания: 17.02.2026 13:02

🔴 Статус: Ожидает обработки
Этап: Передано в закупку
👤 Ответственный: Закупка
📦 Потребность:
Запрошено: 1000 шт
Со склада: 300 шт
В закупку: 700 шт
🚚 Закупка:
Ожидаемая дата отгрузки: —
Дата отгрузки: —
Ожидаемая дата поставки на объект: —
📍 На объекте:
Получено: 0 шт
Остаток: 1000 шт

Закупка нажала «К заявке»

📄 ЗАЯВКА IG-27-1
👷 Прораб: Тимиров
🏗 Объект: Игора
🎯 Цель: Фундамент
📦 Номенклатура: Доска обрезная 25×100×6000
Количество: 1000 шт
📅 Требуется до: 25.02.2026
🕓 Дата создания: 17.02.2026 13:02

🟡 Статус: В работе
Этап: Закупка в работе
👤 Ответственный: Закупка
📦 Потребность:
Запрошено: 1000 шт
Со склада: 300 шт
В закупку: 700 шт
🚚 Закупка:
Ожидаемая дата отгрузки: —
Дата отгрузки: —
Ожидаемая дата поставки на объект: —
📍 На объекте:
Получено: 0 шт
Остаток: 1000 шт

ЗАКУПКА НАЖАЛА «ЗАКУПЛЕНО»
(введена ожидаемая дата отгрузки 22.02.2026)

📄 ЗАЯВКА IG-27-1
👷 Прораб: Тимиров
🏗 Объект: Игора
🎯 Цель: Фундамент
📦 Номенклатура: Доска обрезная 25×100×6000
Количество: 1000 шт
📅 Требуется до: 25.02.2026
🕓 Дата создания: 17.02.2026 13:02

🟡 Статус: В работе
Этап: Закуплено
👤 Ответственный: Закупка
📦 Потребность:
Запрошено: 1000 шт
Со склада: 300 шт
В закупку: 700 шт
🚚 Закупка:
Ожидаемая дата отгрузки: 22.02.2026
Дата отгрузки: —
Ожидаемая дата поставки на объект: —
📍 На объекте:
Получено: 0 шт
Остаток: 1000 шт

ЗАКУПКА НАЖАЛА «ОТГРУЖЕНО»
(введена ожидаемая дата поставки 24.02.2026)

📄 ЗАЯВКА IG-27-1
👷 Прораб: Тимиров
🏗 Объект: Игора
🎯 Цель: Фундамент
📦 Номенклатура: Доска обрезная 25×100×6000
Количество: 1000 шт
📅 Требуется до: 25.02.2026
🕓 Дата создания: 17.02.2026 13:02

🔵 Статус: Передано дальше
Этап: Отгружено поставщиком
👤 Ответственный: Прораб
📦 Потребность:
Запрошено: 1000 шт
Со склада: 300 шт
В закупку: 700 шт
🚚 Закупка:
Ожидаемая дата отгрузки: 22.02.2026
Дата отгрузки: 20.02.2026
Ожидаемая дата поставки на объект: 24.02.2026
📍 На объекте:
Получено: 0 шт
Остаток: 1000 шт

ДОЧЕРНЯЯ ЗАЯВКА IG-27-2
Саморез 5×70 — 50 шт
Всё со склада

Паспорт заявки

🆕 ЗАЯВКА IG-27-2
👷 Прораб: Тимиров
🏗 Объект: Игора
🎯 Цель: Фундамент
📦 Номенклатура: Саморез 5×70
Количество: 50 шт
📅 Требуется до: 25.02.2026
🕓 Дата создания: 17.02.2026 13:02

🔵 Статус: Ожидает получения
Этап: Всё со склада
👤 Ответственный: Прораб
📦 Потребность:
Запрошено: 50 шт
Со склада: 50 шт
В закупку: 0
🚚 Закупка:
Ожидаемая дата отгрузки: —
Дата отгрузки: —
Ожидаемая дата поставки на объект: —
📍 На объекте:
Получено: 0 шт
Остаток: 50 шт

IG-27-2
Саморез 5×70 — 50 шт
Всё со склада
Прораб нажал «Получено полностью»

🆕 ЗАЯВКА IG-27-2
👷 Прораб: Тимиров
🏗 Объект: Игора
🎯 Цель: Фундамент
📦 Номенклатура: Саморез 5×70
Количество: 50 шт
📅 Требуется до: 25.02.2026
🕓 Дата создания: 17.02.2026 13:02

⚪ Статус: Закрыто
Этап: Получено полностью
👤 Ответственный: —
📦 Потребность:
Запрошено: 50 шт
Со склада: 50 шт
В закупку: 0 шт
🚚 Закупка:
Ожидаемая дата отгрузки: —
Дата отгрузки: —
Ожидаемая дата поставки на объект: —
📍 На объекте:
Получено: 50 шт
Остаток: 0 шт

АРХИВНЫЕ ЗАЯВКИ

Список

🔍 Поиск по слову (рабица / саморез / бетон)

⚪ IG-02 | забор | Сетка рабица 23а/22 | 2000 м
Закрыто: 05.02 09:12

ЗАКАЗАТЬ ПОВТОРНО

ПОСМОТРЕТЬ ИСТОРИЮ

История IG-02:
🕓 01.02 19:30 — создан запрос
🕓 01.02 20:10 — обработано ПДО (в закупку 1750 / со склада 250)
🕓 02.02 10:05 — закупка взяла в работу
🕓 02.02 11:40 — указан срок 25.02
🕓 05.02 09:12 — получено полностью (закрыто)

"Контейнер" из которого затем родились заявки - в архиве должен быть в другом цвете и от остальных обработанных заявок этим отличаться. Контейнер сразу после обработки ПДО падает в архив

📦 IG-27 | Игора | Запрос (контейнер)
Разбит ПДО на 2 заявки:
• IG-27-1
• IG-27-2
Создан: 01.02 19:30
Статус: Контейнер обработан

ПОСМОТРЕТЬ ИСТОРИЮ

История запроса IG-27:
01.02 19:30 — создан запрос
01.02 20:05 — обработан ПДО
01.02 20:06 — разбит на:
IG-27-1
IG-27-2

⚪ IG-27-1 | фундамент | Доска 25×100×6000 | 1000 шт
Закрыто: 04.02 12:10

ЗАКАЗАТЬ ПОВТОРНО

ПОСМОТРЕТЬ ИСТОРИЮ

⚫ IG-27-2 | фундамент | Саморез 5×70 | 50 шт
Отменено: 03.02 18:44 (ПДО)

ЗАКАЗАТЬ ПОВТОРНО

ПОСМОТРЕТЬ ИСТОРИЮ

ПДО
После размещения заявки прорабом бот автоматически создает форму эксель для ее полседующего заполнения ПДО. В форме на данном затпе автоматически внесен только ID заявки.

ПДО
Форма ПДО заполняется вручную сверяя данные с 1С и затем грузится снова в бот - дальше бот исходя из внесенных полей в форму принимает решения о стадии закупки и о форме своего сообщения в общую служебную группу

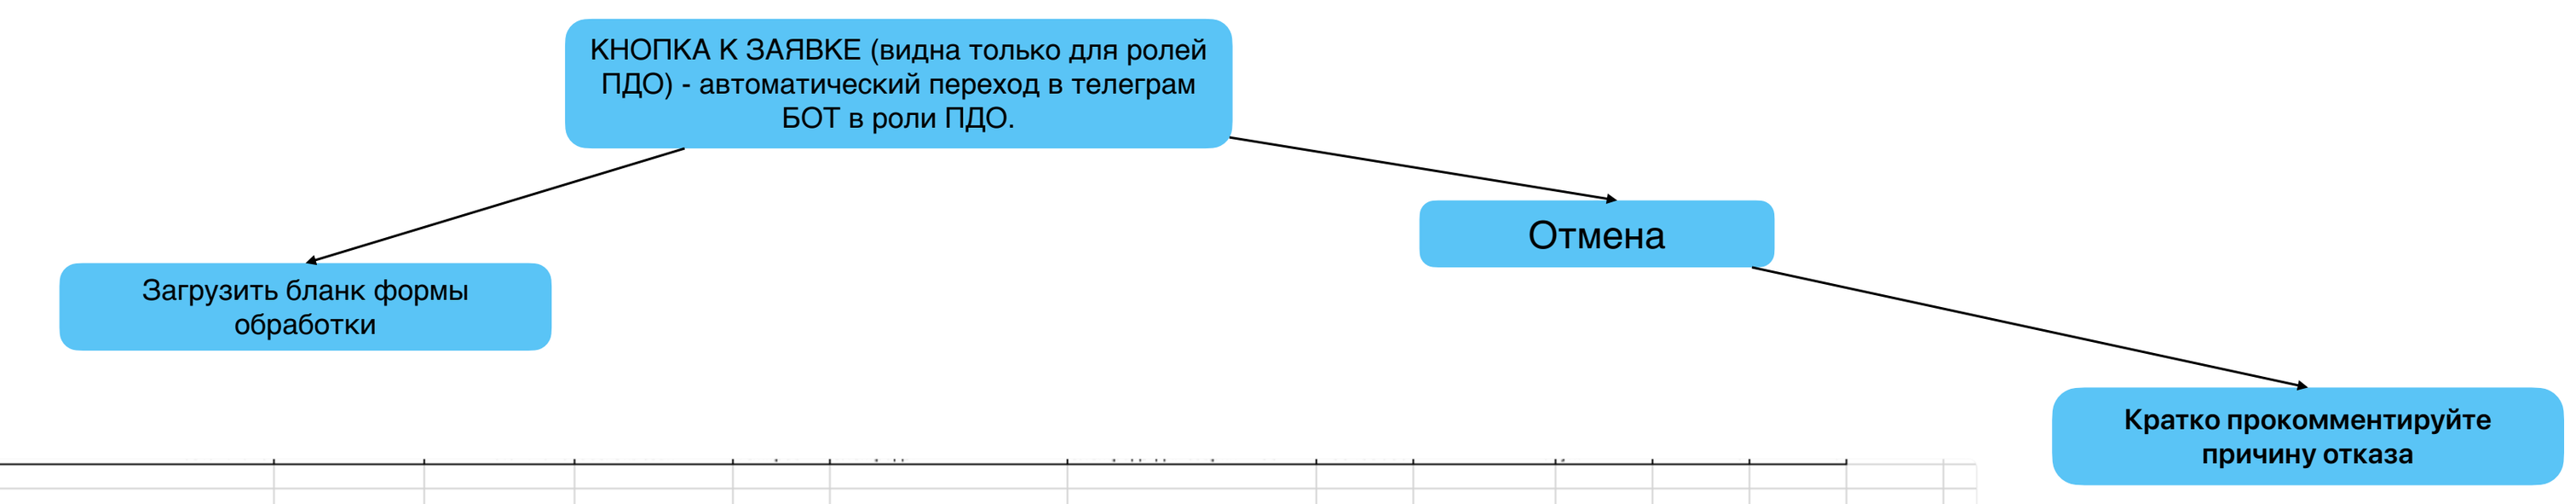

КНОПКА К ЗАЯВКЕ (видна только для ролей ПДО) - автоматический переход в телеграм БОТ в роли ПДО.

Загрузить бланк формы обработки

Отмена

Кратко прокомментируйте причину отказа

Правило формы для таблицы (формула):
Запрошено = Со склада + В закупку

Примерный вид обработанного запроса от ПДО такой файл будет грузиться в бот

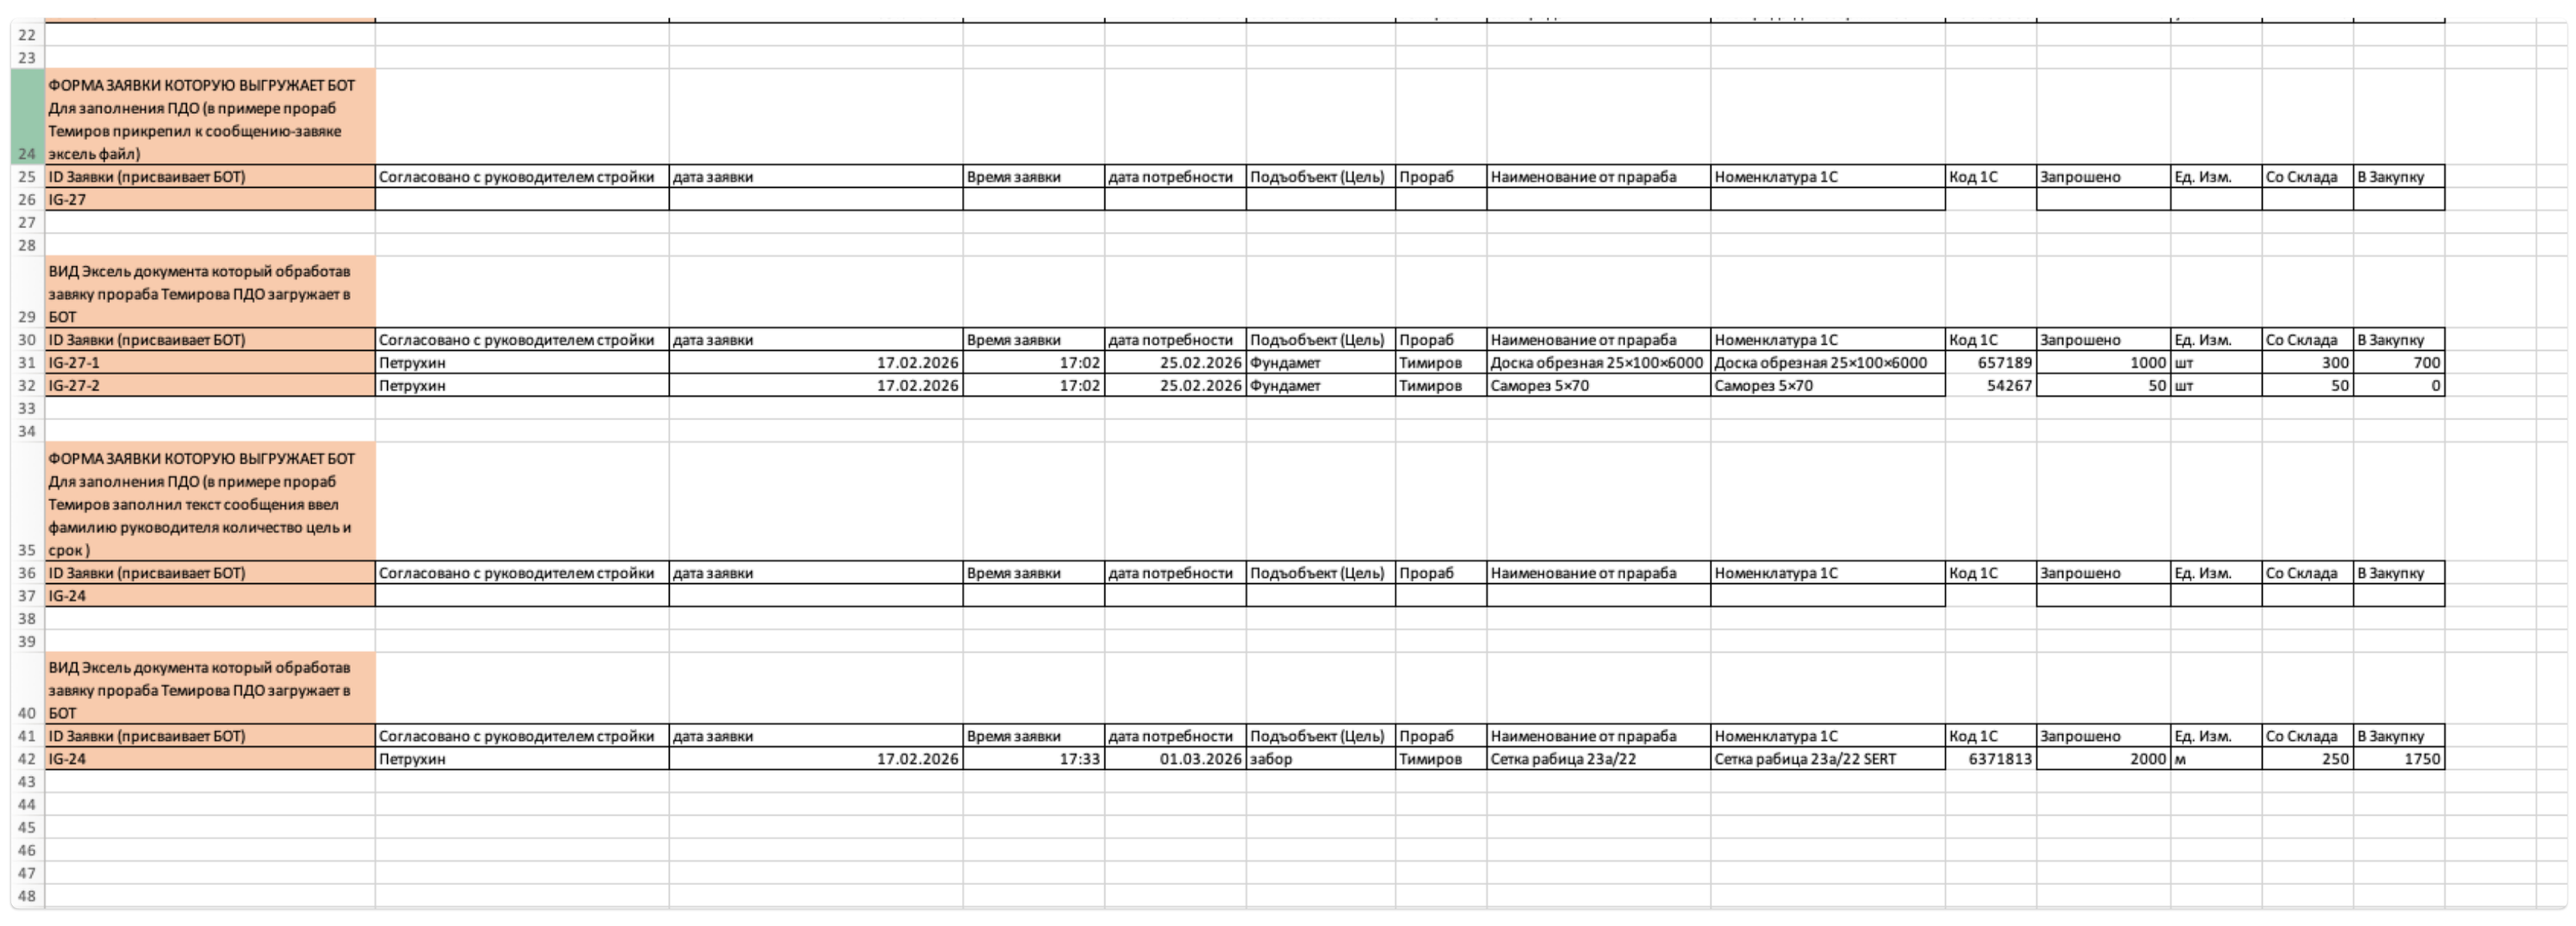

22														
23														
24	ФОРМА ЗАЯВКИ КОТОРУЮ ВЫГРУЖАЕТ БОТ Для заполнения ПДО (в примере прораб Темиров прикрепил к сообщению-заявке эксель файл)													
25	ID Заявки (присваивает БОТ)	Согласовано с руководителем стройки	дата заявки	Время заявки	дата потребности	Подъобъект (Цель)	Прораб	Наименование от прараба	Номенклатура 1С	Код 1С	Запрошено	Ед. Изм.	Со Склада	В Закупку
26	IG-27													
27														
28														
29	ВИД Эксель документа который обработав заявку прораба Темирова ПДО загружает в БОТ													
30	ID Заявки (присваивает БОТ)	Согласовано с руководителем стройки	дата заявки	Время заявки	дата потребности	Подъобъект (Цель)	Прораб	Наименование от прараба	Номенклатура 1С	Код 1С	Запрошено	Ед. Изм.	Со Склада	В Закупку
31	IG-27-1	Петрухин	17.02.2026	17:02	25.02.2026	Фундамет	Тимиров	Доска обрезная 25×100×6000	Доска обрезная 25×100×6000	657189	1000	шт	300	700
32	IG-27-2	Петрухин	17.02.2026	17:02	25.02.2026	Фундамет	Тимиров	Саморез 5×70	Саморез 5×70	54267	50	шт	50	0
33														
34														
35	ФОРМА ЗАЯВКИ КОТОРУЮ ВЫГРУЖАЕТ БОТ Для заполнения ПДО (в примере прораб Темиров заполнил текст сообщения ввел фамилию руководителя количество цель и срок)													
36	ID Заявки (присваивает БОТ)	Согласовано с руководителем стройки	дата заявки	Время заявки	дата потребности	Подъобъект (Цель)	Прораб	Наименование от прараба	Номенклатура 1С	Код 1С	Запрошено	Ед. Изм.	Со Склада	В Закупку
37	IG-24													
38														
39														
40	ВИД Эксель документа который обработав заявку прораба Темирова ПДО загружает в БОТ													
41	ID Заявки (присваивает БОТ)	Согласовано с руководителем стройки	дата заявки	Время заявки	дата потребности	Подъобъект (Цель)	Прораб	Наименование от прараба	Номенклатура 1С	Код 1С	Запрошено	Ед. Изм.	Со Склада	В Закупку
42	IG-24	Петрухин	17.02.2026	17:33	01.03.2026	забор	Тимиров	Сетка рабица 23а/22	Сетка рабица 23а/22 SERT	6371813	2000	м	250	1750
43														
44														
45														
46														
47														
48														

разрезание происходит строго при приёме Excel от ПДО.
До этого в группе существует один объект IG-12 со статусом “Ожидает решения ПДО”.
После загрузки формы: бот публикует событие “созданы дочерние заявки”, и дальше живут только дочерние (каждая отдельным сообщением в группе).
Родитель IG-12 становится “контейнером истории” и уходит в архив/ссылку “история”.

Закупка
В служебной группе для всех ролей закупщиков появляется сообщение по конкретной заявке со статусом "в закупку" и внизу INLINE кнопка - "к заявке".

🧭 Вход закупки в процесс
Статус в группе до действий закупки
🔴 Статус: Ожидает обработки
Этап: Ожидает обработки закупкой
👤 Ответственный: Закупка

1️⃣ ДО ПРИНЯТИЯ В РАБОТУ
Кнопки:
✅ В работу
🔁 Вернуть ПДО
❌ Отменить
(Отменить допустимо только если заказ ещё не размещён.)

2️⃣ ПОСЛЕ «В работу»
Статус:
🟡 Статус: В работе
Этап: Закупка в работе
👤 Ответственный: Закупка
Кнопки:
📦 Закуплено
🔁 Вернуть ПДО
❌ Отменить
(Отменить допустимо пока заказ не размещён у поставщика.)

3️⃣ ПОСЛЕ «Закуплено»
Бот запрашивает:
→ Ожидаемую дату отгрузки

Статус:
🟡 Статус: В работе
Этап: Закуплено
👤 Ответственный: Закупка
Кнопки:
🚚 Отгружено
🔁 Вернуть ПДО
❗ Кнопка "Отменить" здесь уже исчезает.
Заказ размещён — назад только через возврат.

4️⃣ ПОСЛЕ «Отгружено»
Бот запрашивает:
→ Ожидаемую дату поставки на объект

Статус:
🔵 Статус: Передано дальше
Этап: Отгружено поставщиком
👤 Ответственный: Прораб

до нажатия “Закуплено” отмена возможна,
после “Закуплено” отмены нет, только возврат/корректировка отдельным процессом.

БОТ РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЬ

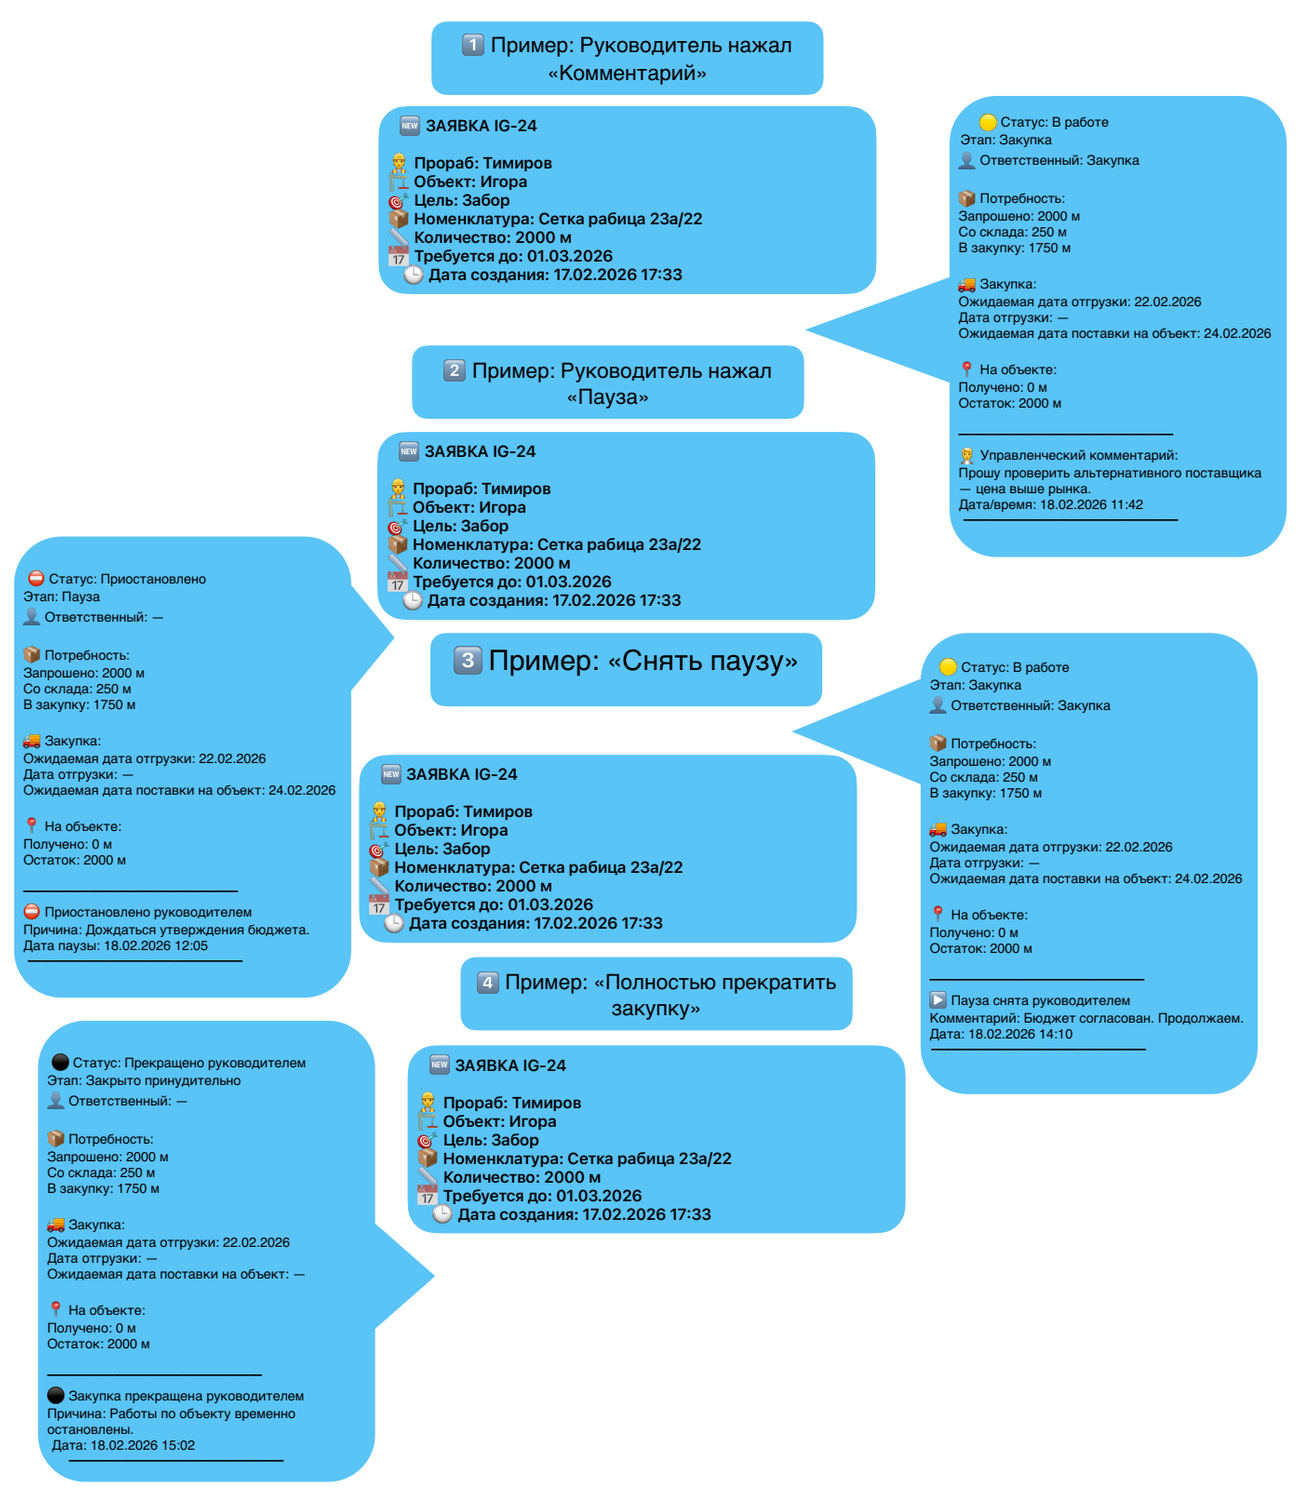

1️⃣ Пример: Руководитель нажал «Комментарий»

🆕 ЗАЯВКА IG-24
👷 Прораб: Тимиров
🏗 Объект: Игора
🎯 Цель: Забор
📦 Номенклатура: Сетка рабица 23а/22
Количество: 2000 м
📅 Требуется до: 01.03.2026
🕓 Дата создания: 17.02.2026 17:33

🟡 Статус: В работе
Этап: Закупка
👤 Ответственный: Закупка
📦 Потребность:
Запрошено: 2000 м
Со склада: 250 м
В закупку: 1750 м
🚚 Закупка:
Ожидаемая дата отгрузки: 22.02.2026
Дата отгрузки: —
Ожидаемая дата поставки на объект: 24.02.2026
📍 На объекте:
Получено: 0 м
Остаток: 2000 м
————————————
👷 Управленческий комментарий:
Прошу проверить альтернативного поставщика — цена выше рынка.
Дата/время: 18.02.2026 11:42
————————————

2️⃣ Пример: Руководитель нажал «Пауза»

🆕 ЗАЯВКА IG-24
👷 Прораб: Тимиров
🏗 Объект: Игора
🎯 Цель: Забор
📦 Номенклатура: Сетка рабица 23а/22
Количество: 2000 м
📅 Требуется до: 01.03.2026
🕓 Дата создания: 17.02.2026 17:33

⛔ Статус: Приостановлено
Этап: Пауза
👤 Ответственный: —
📦 Потребность:
Запрошено: 2000 м
Со склада: 250 м
В закупку: 1750 м
🚚 Закупка:
Ожидаемая дата отгрузки: 22.02.2026
Дата отгрузки: —
Ожидаемая дата поставки на объект: 24.02.2026
📍 На объекте:
Получено: 0 м
Остаток: 2000 м
————————————
⛔ Приостановлено руководителем
Причина: Дождаться утверждения бюджета.
Дата паузы: 18.02.2026 12:05
————————————

3️⃣ Пример: «Снять паузу»

🆕 ЗАЯВКА IG-24
👷 Прораб: Тимиров
🏗 Объект: Игора
🎯 Цель: Забор
📦 Номенклатура: Сетка рабица 23а/22
Количество: 2000 м
📅 Требуется до: 01.03.2026
🕓 Дата создания: 17.02.2026 17:33

🟡 Статус: В работе
Этап: Закупка
👤 Ответственный: Закупка
📦 Потребность:
Запрошено: 2000 м
Со склада: 250 м
В закупку: 1750 м
🚚 Закупка:
Ожидаемая дата отгрузки: 22.02.2026
Дата отгрузки: —
Ожидаемая дата поставки на объект: 24.02.2026
📍 На объекте:
Получено: 0 м
Остаток: 2000 м
————————————
▶️ Пауза снята руководителем
Комментарий: Бюджет согласован. Продолжаем.
Дата: 18.02.2026 14:10
————————————

4️⃣ Пример: «Полностью прекратить закупку»

🆕 ЗАЯВКА IG-24
👷 Прораб: Тимиров
🏗 Объект: Игора
🎯 Цель: Забор
📦 Номенклатура: Сетка рабица 23а/22
Количество: 2000 м
📅 Требуется до: 01.03.2026
🕓 Дата создания: 17.02.2026 17:33

⚫ Статус: Прекращено руководителем
Этап: Закрыто принудительно
👤 Ответственный: —
📦 Потребность:
Запрошено: 2000 м
Со склада: 250 м
В закупку: 1750 м
🚚 Закупка:
Ожидаемая дата отгрузки: 22.02.2026
Дата отгрузки: —
Ожидаемая дата поставки на объект: —
📍 На объекте:
Получено: 0 м
Остаток: 2000 м
————————————
⚫ Закупка прекращена руководителем
Причина: Работы по объекту временно остановлены.
Дата: 18.02.2026 15:02
————————————
